



CODE 1기 종합 프로젝트 가이드

SAP

Public

Agenda



- 1 프로젝트 일정
- 2 프로젝트 추진 단계
- 3 시스템 아키텍처
- 4 프로젝트 주제
- 5 프로젝트 업무 프로세스
- 6 Ground Rule



1

프로젝트 일정

2

프로젝트 추진 단계

3

시스템 아키텍처

4

프로젝트 주제


5

프로젝트 업무 프로세스

6

Ground Rule

1-1. 프로젝트 개요

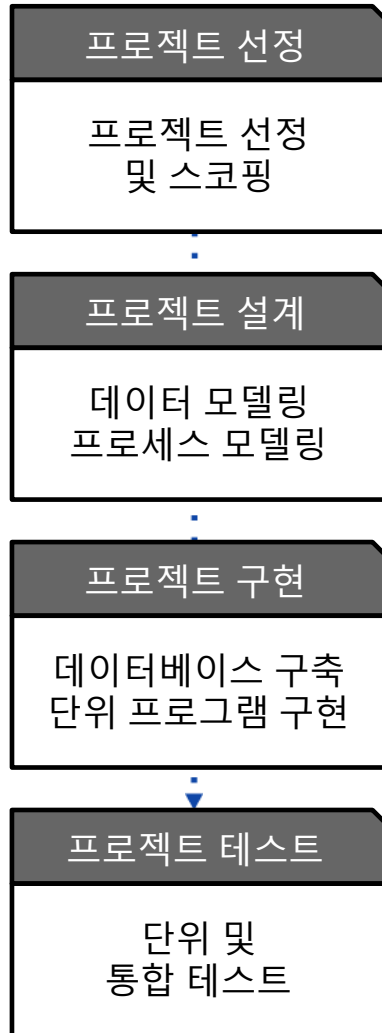


조별 구현 프로젝트 주제를 선정하고,
이를 기반으로 기업 업무 환경 기반의 단위 업무를 선별

선별된 단위 업무를 기반으로, 데이터 베이스 및 시스템 구축을 위한
데이터 모델링 및 프로세스 모델링을 진행

분석 및 설계된 모델링을 중심으로 학습한 내용을 접목하여, 데이터베이스 구축, 단위 프로그램
구현, OData 서비스 설계 및 구현과 사용자 경험을 고려한 UX를 구현

단위 및 통합 테스트 스크립트를 작성하고, 이를 바탕으로 구축된 시스템의 모든 기능과
프로세스를 검증

1-2. 프로젝트 일정

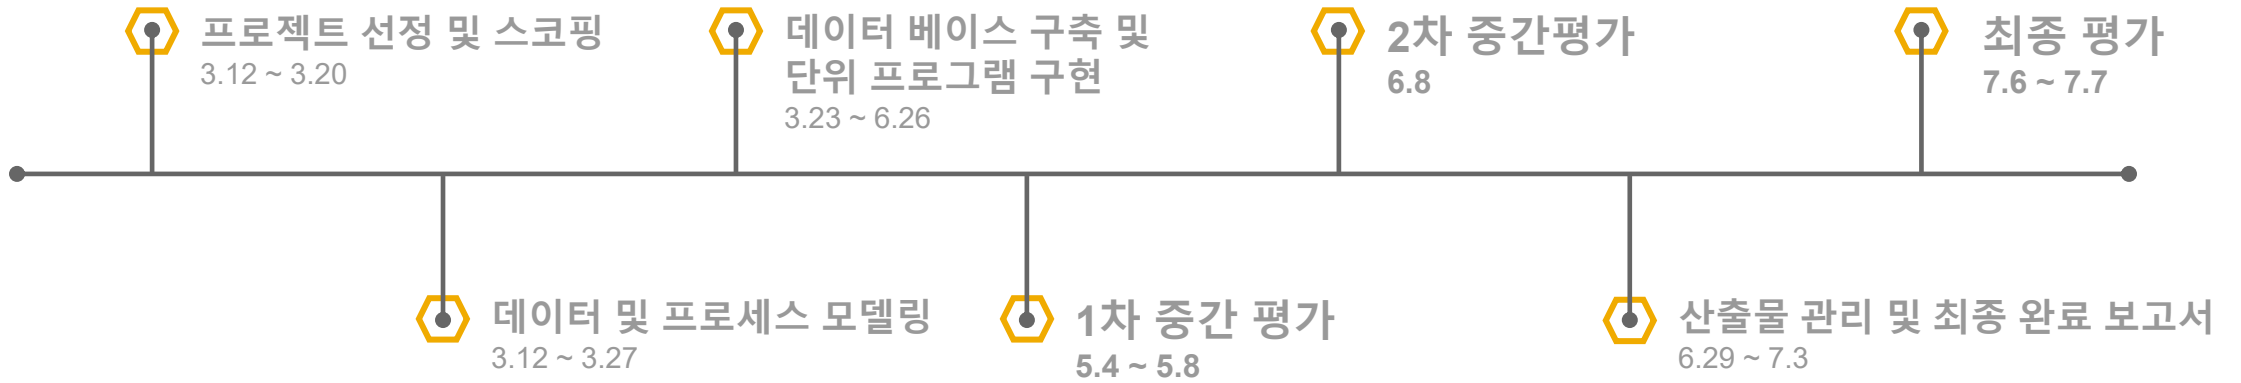

1-3. 프로세스 설계 리뷰 일정

CL1, CL2 1차 유주미 파트너, 김성광 파트너
2차 오요한 파트너, 유주미 파트너

3/16	3/17	3/18	3/19	3/20
Proj	Proj	Proj	Proj	Proj
3/23	3/24	3/25	3/26	3/27
1차 리뷰	Proj	Proj	Proj	Proj
3/30	3/31	4/1	4/2	4/3
2차 리뷰	Proj	Proj	Proj	Proj

CL4, CL6 1차 김성광 파트너, 심예진 파트너
2차 김광진 파트너, 심예진 파트너

3/16	3/17	3/18	3/19	3/20
Proj	Proj	Proj	Proj	Proj
3/23	3/24	3/25	3/26	3/27
Proj	Proj	1차 리뷰	Proj	Proj
3/30	3/31	4/1	4/2	4/3
Proj	Proj	2차 리뷰	Proj	Proj

CL1		
3/23	09:00~13:50	14:00~17:50
	김성광 P	유주미 P
3/30	09:00~14:00	14:00~17:50
	오요한 P	유주미 P
CL2		
3/23	09:00~13:50	14:00~17:50
	유주미 P	김성광 P
3/30	09:00~13:50	14:00~17:50
	유주미 P	오요한 P

CL3, CL5 1차 정재훈 파트너, 김진수 파트너
2차 김진수 파트너, 정재훈 파트너

3/16	3/17	3/18	3/19	3/20
Proj	Proj	Proj	Proj	Proj
3/23	3/24	3/25	3/26	3/27
Proj	1차 리뷰	Proj	Proj	Proj
3/30	3/31	4/1	4/2	4/3
Proj	2차 리뷰	Proj	Proj	Proj

CL3		
3/24	09:00~13:50	14:00~17:50
	정재훈 P	김진수 P
3/31	09:00~13:50	14:00~17:50
	정재훈 P	김진수 P
CL5		
3/24	09:00~13:50	14:00~17:50
	김진수 P	정재훈 P
3/31	09:00~13:50	14:00~17:50
	김진수 P	정재훈 P

CL7 1차 김성광 파트너, 심예진 파트너
2차 문주희 파트너, 심예진 파트너

3/16	3/17	3/18	3/19	3/20
Proj	Proj	Proj	Proj	1차 리뷰
3/23	3/24	3/25	3/26	3/27
Proj	Proj	Proj	Proj	2차 리뷰
3/30	3/31	4/1	4/2	4/3
Proj	Proj	Proj	Proj	Proj

CL7		
3/20	09:00~13:50	14:00~17:50
	김성광 P	심예진 P
3/27	09:00~13:50	14:00~17:50
	문주희 P	심예진 P

1-4. 프로젝트 중간 평가

평가시기	평가비중	평가방법	진행 방식 및 평가 기준
중간 1차 평가 (2026.05.04(월) ~ 2026.05.08(금))	70%	(개별) 중간 프로그램 테스트 (80%)	진행 방식 본인이 만든 2개의 프로그램 (T-code, 주요 기능, DB 테이블 리스트 등) 제출 - 트랜잭션 프로그램 1, 조회용 프로그램 1 평가 기준 기술적인 부분, 유효성 검사, 사용자 친화적 인터페이스, 완성도 등 확인 - 프로세스 시연 중 오류 및 덤프 여부
		(개별) 주차별 개발 레포트 (20%)	진행 방식 본인이 개발한 (혹은 개발중인) 프로그램 (주요 기능 등) 제출 - 해당 프로그램의 어떤 기능을 개발했는지 작성 평가 기준 - 제출 성실성, 내용 충실도 - 기능 이해도
중간 2차 평가 (2026.06.08(월))	30%	(조별) 단위 테스트	진행 방식 - 조별 통합 테스트 시나리오 사전 작성 - 해당 통합 테스트 시나리오를 통해 평가 평가 기준 - 프로젝트 주제와 컨셉에 맞는 핵심 프로그램 여부 - 프로젝트 주제의 Business Challenge에 해당하는 TO-BE 프로그램 여부 - 프로세스 시연의 원활성 (데이터 흐름 시나리오, 속도, 시간 준수 등) - 조 내에서 조원들의 프로그램끼리 통일성 여부

* 가장 중요한 평가 기준만 명시하였으며, 상세기준은 추가/삭제 될 수 있음

* 취업연계시 개인 평가 & 조별 평가 가중치 : 개인평가(70%) + 조별 평가 (30%) - 중간평가 점수, 최종평가 점수 따로 기업에 공유 됨

* 우수 조 선발은 조별 최종 평가를 기준으로 진행

1-5. 프로젝트 최종 평가

평가시기	평가비중	평가방법	진행 방식 및 평가 기준
최종평가 (2026.07.06(월) ~ 2026.07.07(화))	30%	(조별) 발표 평가 (조 점수의 40%)	진행 방식 - 발표자가 전체 프로젝트 소개 및 조별 대표 프로그램 설명 (시연영상 포함) 평가 기준 - 시나리오 설명과 완성도, 시연 프로그램의 우수성, 발표자의 발표 역량 등
		(조별) 통합 테스트 (조 점수의 60%)	진행 방식 - 조별 통합 테스트 시나리오 사전 작성 - 해당 통합 테스트 시나리오를 통해 평가 (*Fiori는 런치패드 실행 필수) 평가 기준 - 그라운드 룰 준수 여부, 덤프가 나지 않는지, 데이터의 정합성 - 프로젝트 주제의 Business Challenge에 해당하는 TO-BE 프로그램 여부 - 중간 2차 평가 시 보완사항 수정 여부
	70%	(개별) 대표 프로그램 테스트 (80%)	진행 방식 - 개인 당 1개의 report 제출 (사전에 양식 제공) - 수정 사항을 반영한 중간 1차 평가 프로그램, 신규 ABAP 프로그램 1, 신규 Fiori 프로그램 1 평가 기준 기술적인 부분, 유효성 검사, 사용자 친화적 인터페이스, 완성도 등 - 프로세스 시연 중의 오류 및 덤프 여부 - 유효성 검사 및 사용자 친화적 인터페이스 - 1차 개별 평가 피드백 반영 여부
		(개별) 주차별 개발 레포트 (20%)	진행 방식 본인이 개발한 (개발중인) 프로그램 (T-code, 주요 기능, DB 테이블 리스트 등) 제출 - 해당 프로그램의 어떤 기능을 개발했는지 작성 평가 기준 - 제출 성실성, 내용 충실도 - 기능 이해도 표현

* 중간 평가와 동일하게 상세기준은 추가/삭제 될 수 있음



1

프로젝트 일정

2

프로젝트 추진 단계

3

시스템 아키텍처

4

프로젝트 주제


5

프로젝트 업무 프로세스

6

Ground Rule

2-1. 프로젝트 추진단계 순서

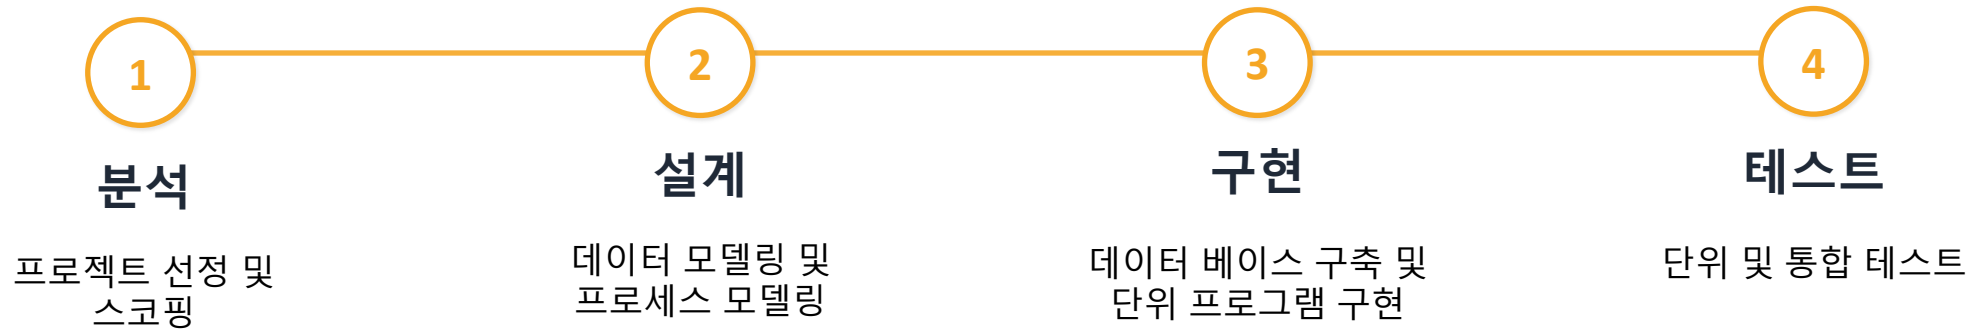

2-1. 프로젝트 추진단계 - 분석

1) 분석 : 프로젝트 선정 및 스코핑

분류	프로젝트 선정 및 스코핑	AS-IS / TO-BE 분석
주요내용	· 기업 내 단위 업무 선정 · 업무 현황 분석을 통한 문제점 파악 · 개선 방향 및 프로젝트 범위(Scope) 정의 · 프로젝트 목표 및 추진 방향 설정	· 현행 업무 프로세스(AS-IS) 분석 · 업무 흐름 상의 비효율 및 문제점 도출 · 개선된 업무 프로세스(TO-BE) 설계 · AS-IS 대비 TO-BE 개선 사항 정리
산출물	· 프로젝트 계획서 · 프로젝트 계획서 시청각 교육	· AS-IS 분석 문서 · TO-BE 분석 문서 · AS-IS, TO-BE 문서 시청각 교육
성과	· 프로젝트 전반의 방향성을 사전에 정립함으로써 추진 과정에서의 시행착오를 최소화함	· 기업 프로젝트 진행 단계를 간접적으로 체험함으로써 실제 프로젝트 투입 시 역량 공백 최소화 · 업무 분석 및 개선 아이디어 도출 역량 함양

2-2. 프로젝트 추진단계 - 설계

2) 설계: 데이터 모델링 및 프로세스 모델링

분류	데이터 모델링	프로세스 모델링
주요내용	· 업무 분석 결과를 기반으로 엔터티(Entity) 도출 · 엔터티 간 관계 정의 및 속성 설계 · ERD(Entity Relationship Diagram) 작성 · 엔터티별 테이블 기술서 작성	· 전체 업무 기능 구조 정의 · 기능 단위별 업무 처리 절차 정리 · 프로세스 흐름 다이어그램(PFD) 설계
산출물	· 엔터티 관계 다이어그램(ERD) · 테이블 기술서 · DB설계 시청각 교육 · 테이블 기술서 시청각 교육	· 업무 기능 분해도 · 프로세스 흐름 다이어그램(PFD) · 프로세스 흐름 다이어그램 시청각 교육
성과	· 물리적 데이터베이스 설계에 대한 이해 · ERD 및 Entity Specification 작성 능력 함양	· 업무 구성 및 처리 절차에 대한 이해도 향상 · 프로세스 중심 설계 역량 함양

2-3. 프로젝트 추진단계 - 구현

3) 구현: 데이터베이스 구축 및 단위 프로그램 구현

분류	데이터베이스 구축	단위 프로그램 구현 - 유지보수 뷰
주요내용	· 도메인 및 데이터 엘리먼트 설계 · 물리적 테이블 및 데이터베이스 뷰 구현 · 시스템 퍼포먼스 증가를 위한 인덱스 및 버퍼링 설정	· 환경 설정 및 코드 데이터 관리용 유지보수 뷰 구현 · 관련 데이터 통합 관리를 위한 뷰 클러스터 설계
산출물	· ABAP Dictionary ERD · ABAP Dictionary 시청각 교육	· Functional Spec(FS) · Technical Spec(TS) · Functional Spec 시청각 교육 · Technical Spec 시청각 교육
성과	· 테이블 기술서를 기반으로 한 물리적 테이블 설계 능력 함양 · 데이터베이스 구조 및 성능 고려 역량 강화	· 설정, 코드, 텍스트 데이터 관리 프로그램 개발 능력 함양

2-3. 프로젝트 추진단계 - 구현

3) 구현: 데이터베이스 구축 및 단위 프로그램 구현

분류	단위 프로그램 구현 - 리포트 프로그램	단위 프로그램 구현 - 트랜잭션 프로그램
주요내용	· 조회 조건에 따른 데이터 추출 로직 구현 · Open SQL을 활용한 데이터 조회 및 가공	· 마스터 및 트랜잭션 데이터 처리 로직 구현 · 입력 값 검증 및 데이터 처리 프로세스 구현
산출물	· Functional Spec(FS) · Technical Spec(TS) · Functional Spec 시청각 교육 · Technical Spec 시청각 교육	· Functional Spec(FS) · Technical Spec(TS) · Functional Spec 시청각 교육 · Technical Spec 시청각 교육
성과	· Open SQL을 활용한 대량 데이터 추출 및 가공 능력 함양	· 마스터 및 트랜잭션 데이터 처리 프로그램 개발 능력 함양

2-3. 프로젝트 추진단계 - 구현

3) 구현: 데이터베이스 구축 및 단위 프로그램 구현

분류	단위 프로그램 구현 – OData 서비스	단위 프로그램 구현 – Fiori
주요내용	· 기업 여러 시스템 환경 및 모바일에서 데이터를 추출 및 가공을 위한 데이터 처리 기반의 서비스 구현 · 외부 시스템 및 UI 연계를 고려한 서비스 구성	· OData 서비스 연계 Fiori 애플리케이션 구현 · 사용자 역할(Role) 기반 화면 구성 · 런치패드 연계를 통한 사용자 접근 구조 설계
산출물	· Functional Spec(FS) · Technical Spec(TS) · OData 시청각 교육	· Functional Spec(FS) · Technical Spec(TS) · 런치패드 사용자별 롤 설계 시청각 교육
성과	· 모바일 환경으로 비즈니스 확장을 위한 OData 서비스 구현 역량 함양	· 사용자 역할 기반 런치패드 설계 능력 함양 · 모바일 기반 Fiori 앱 구현 역량 강화

2-4. 프로젝트 추진단계 - 테스트



4) 테스트: 단위 및 통합 테스트

분류	단위 테스트	통합 테스트	최종 완료 보고
주요내용	· 단위 프로그램별 기능 테스트 수행 · 입력/조회/수정/삭제 기능 검증 · 오류 분석 및 수정 작업 수행	· 단위 프로그램 간 연계 테스트 수행 · 데이터 흐름 및 정합성 검증 · 업무 프로세스 기준 전체 흐름 점검	· 프로젝트 결과 정리 및 문서화 · 사용자 관점의 매뉴얼 작성
산출물	· 단위 테스트 결과서 · 단위테스트 결과서 시청각 교육 · 소프트웨어 개발 중 테스트 시청각 교육	· 통합 테스트 결과서 · 단위 통합 테스트 및 결과서 시청각 교육 · 통합테스트 및 안정화 시청각 교육	· 사용자 매뉴얼 · 완료 보고서 · IT 각종 보고서 시청각 교육
성과	· 기능별 상세 테스트 수행 능력 함양 · 프로그램 안정성 검증 및 오류 분석 역량 강화	· 프로세스 중심의 프로그램 연계 테스트 능력 함양 · 데이터 흐름 및 시스템 전체 이해도 향상	· 사용자 관점의 문서 작성 능력 함양 · Go-Live를 위한 프로젝트 마무리 경험 확보



- 1 프로젝트 일정
- 2 프로젝트 추진 단계
- 3 시스템 아키텍처
- 4 프로젝트 주제
- 5 프로젝트 업무 프로세스
- 6 Ground Rule

3. 시스템 아키텍처

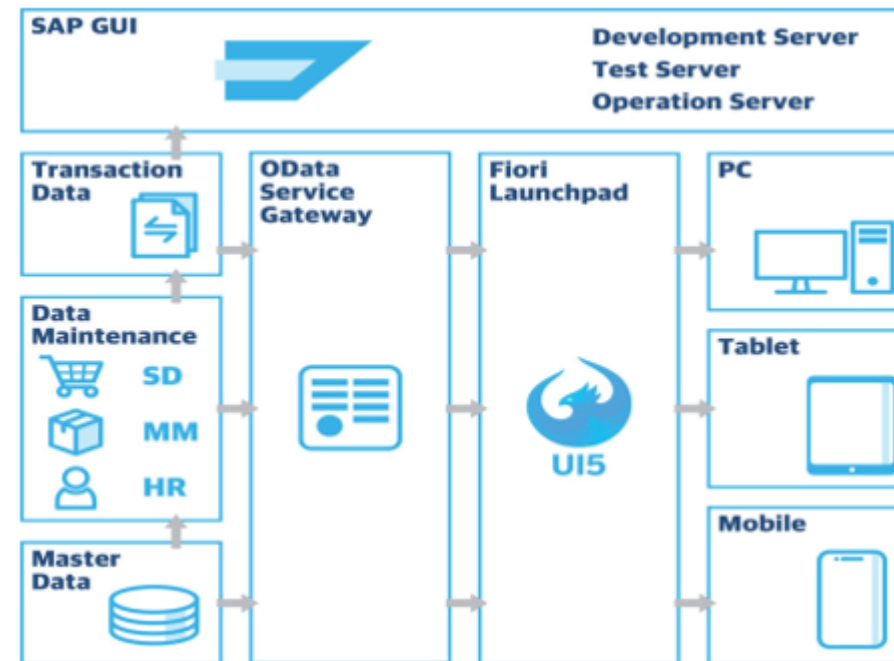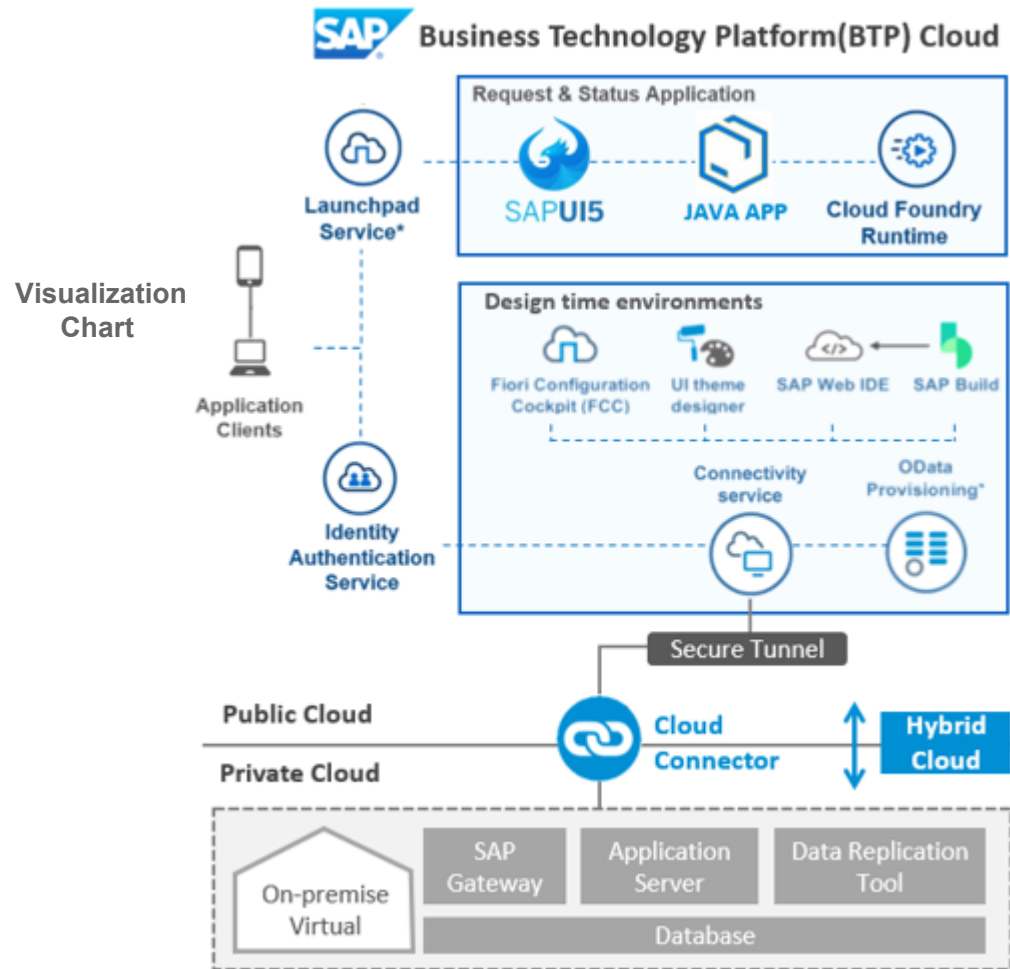



- 1 프로젝트 일정
- 2 프로젝트 추진 단계
- 3 시스템 아키텍처
- 4 프로젝트 주제
- 5 프로젝트 업무 프로세스
- 6 Ground Rule

4. 프로젝트 주제 (조별 택 1)

- 가상 기업 및 기업이 현재 겪고 있는 어려움에 대해서 사전 설정 (7개 회사)
- Business Challenge를 고려하여 TO-BE 프로세스 직접 설정
- 한 반 내에서 주제가 겹쳐도 무관

참고 사항

- **Business Challenge** 굵은 글씨 01~05를 모두 충족시켜야 함
 - Business Challenge 굵은 글씨 아래 세부 사항을 적어도 **각각 1개 이상**은 반영해야 함 - 충족시키지 않을 경우 감점 처리
 - 세부 사항들을 모두 충족시키지는 않아도 되나 최대한 반영할 것
 - 모바일 앱 구현이 필요한 경우 UI5를 사용하여 구현
- **사전에 설정된 Business Challenge에 대해서는 변경 불가**
- **기업 소개와 Business Challenge의 내용에서 벗어나지 않는다면 나머지 AS-IS는 창의적으로 생각해도 됨**
 - 기업 명, 지사 개수, Product 상세 종류, 창고 개수, 직원 수 등 명시되지 않은 회사 정보는 조별로 자체 상의하여 결정 가능
 - 화면 구현 시 로고 등이 필요할 경우 조 내에서 자체 제작 가능
- **Business Challenge를 반영한 후에도 추가적인 AS-IS를 가정하고 싶다면 이 부분은 추가해도 무방**
- **03/13일 금요일 18시까지 조별 기업 선정해서 제출해야 함** (사내강사 조사 예정) : **이후 변경 불가**
- **본 교육 과정에서 배우지 않은 개발 프로그램(예: React, Python 등)은 사용이 금지되며 평가에 포함되지 않음**

핵심 사업 모델



제품 사양 및 모델 관리



수요 기반 생산계획 수립



자재 소요 및 재고 관리

Business Challenges

시즌 수요 기반 통합 생산 계획 자동 연계 부족

- 시즌별 판매계획 및 해외 오더 정보가 생산계획에 즉시 반영되지 않음
- 수요 급증 시 생산오더를 수동으로 생성하여 계획 대응 지연 발생
- 긴급 출하 요청 발생 시 기존 생산 일정 재조정이 체계적으로 이루어지지 않음

브랜드, 모델별 전용 자재 관리 통제 미흡

- 브랜드, 제품 모델별 사용 가능 자재 기준이 명확히 관리되지 않음
- 설계 기준에 없는 자재가 BOM에 등록되는 사례 발생
- 자재 변경 시 브랜드 사의 사양 검증 및 승인 프로세스 부재

납품 이후 문제 발생 시 추적 정보 분산

- 출하된 제품이 어떤 생산오더/LOT/자재로 만들어졌는지 추적 어려움
- 품질 결함 시 공급사 측의 과실을 입증하기 어려워 불량 자재에 대한 변상이나 비용 정산이 불가능
- 고객 클레임 현황 관리 시스템 부재로 원인 파악 및 대응에 시간 소요

제품 및 고객 단위 수익성 분석 체계 미흡

- 신발 모델별로 다른 자재비, 제작비를 정밀하게 집계하지 못해 실제 마진 파악이 어려움
- 거래처 유형별 매출 및 마진 차이 분석 체계 부재로 인한 전략적 거래처 관리에 한계
- 자재 단가 변동이 제품별 매출원가 및 손익에 미치는 영향을 즉시 확인하기 어려움

현장 중심 업무의 모바일 지원 체계 미흡

- 생산과 품질, 출하 현장 정보가 PC 기반으로만 관리되어 즉시 입력이 어려움
- 긴급 수출 오더 발생 시 현장 진행 상황을 실시간으로 파악하기 어려움
- 설비 점검 및 품질 검사 결과가 모바일에서 즉시 기록 및 공유되지 않음

핵심 사업 모델



자전거 대량 생산 및 조립



표준 BOM 기반 부품 관리



국내 B2B 채널 중심 판매 및 출고

Business Challenges

생산 계획 안정성 저하

1

- 거래처 주문 시점과 물량 편차 확대로 생산 일정 재조정이 빈번하게 발생
- 생산계획 수립 시 실제 자재 가용 수량이 충분히 반영되지 않아 계획 대비 생산 차질 발생
- 생산계획 미흡으로 긴급 생산오더 투입이 반복 발생되어 생산 안정성이 저하

옵션 증가로 인한 BOM 및 자재 복잡도 상승

2

- 모델별 옵션 조합 확대로 BOM 버전 관리 부담이 지속적으로 증가
- 유사 부품의 다중 코드 운영으로 자재 관리 효율성이 저하
- 옵션 단위 안전재고 기준 미흡으로 부품 과잉 및 부족 현상 반복

판매-출하-재무 데이터가 단계별로 운영됨

3

- 주문 변경 사항이 생산 및 재고 계획에 즉시 반영되지 않아 운영 지연이 발생
- 출하 이후 매출 및 원가 반영 시점 간 시간 차가 발생
- 반품, 교환 정보가 수익성 분석에 즉시 연계되지 않아 저마진 거래처 및 제품 식별에 시간이 소요

재고 자산이 전략적 관리 대상이 아닌 수량 중심으로 운영

4

- 재고 수량 중심 관리로 회전을 및 장기 체류 자재에 대한 선제적 대응이 어려움
- 부품 단가 변동이 재고 평가 및 원가에 즉시 반영되지 않아 실시간 손익 변동 분석에 한계

모바일 기반 실시간 협업 및 의사결정 지원 체계 부족

5

- 영업 담당자가 현장에서 주문 가능 재고, 예상 납기, 가격 조건을 실시간으로 확인하기 어려움
- 대리점 및 B2B 고객과의 협의 과정에서 즉시 견적 생성 및 조건 반영이 어려워 계약 리드타임 증가
- 경영진 및 관리자가 외부 환경에서 생산 및 매출 현황을 실시간으로 확인하기 어려움

기업 3 : 영유아 교구 구독 서비스 제공 기업

영유아의 발달 단계에 맞춘 맞춤형 교구를 정기 배송하는 구독 서비스 제공 기업

대주제 : 구독과 렌탈을 위한 판매 및 통합 재무관리 서비스

핵심 사업 모델



월령별 맞춤형 교구 구독



프리미엄 콘텐츠 결합 모델



기관대상 B2B 구독 계약

Business Challenges

1

구독 이탈 예측 및 관리 체계 부재

- 월령 구간 및 구독 유형별 이탈 패턴 분석 미흡
- 이탈 전 징후 데이터 통합 분석 및 선제 대응 체계 부족
- 이탈 고객 관리 및 재구독 유도 체계 미흡

2

재고 가시성 및 물류 흐름 통합 관리 체계 부재

- 시스템 재고와 실제 물류센터 재고 간 차이 발생
- 반품 교구의 재입고 처리 지연으로 가용 재고 정확성 저하
- 월령별 패키지 구성품 단위 재고 추적이 어려워 부분 품절 발생

3

구독 계약, 정산 및 매출 인식 통합 관리 미흡

- 출고 완료 시점과 매출 인식 시점이 명확히 자동 연계되지 않음
- 해지와 일시정지, 환불 발생 시 수작업 정산으로 오류 발생 가능
- 구독 유형별 매출과 매출원가 연결 구조가 체계화되지 않아 정확한 마진 산출 어려움

4

구독 변경 및 운영 일정 통합 관리 체계 미흡

- 구독 옵션 변경 발생 시 패키징 일정에 즉시 반영되지 않음
- 월말 구독 변경 집중 시 물류 출고 일정 충돌 발생
- 긴급 교체 요청 및 클레임 발생 시 운영 조정 체계 미흡

5

모바일 환경 미비

- 경영진 및 관리자들이 외부 환경에서 실시간 정보 조회 불가능
- 물류센터 및 현장 작업자가 출고, 반품, 재입고 정보를 즉시 시스템에 입력하지 못해 데이터 반영 시차 발생
- 품절, 배송 지연, 대량 해지 발생 등 긴급 이슈 발생 시 모바일 기반 즉각 대응 체계 부재

핵심 사업 모델



농/축/수산물 및 가공품 유통



고객업체별 수요 예측 및 생산



신선식품 중심의 출고

Business Challenges

1

유통기한 및 배치 기반 출고 통제 미흡

- 농/축/수산물은 산지, 가공일자, 공급업체별로 품질 특성이 달라 배치 구분이 필요하나 사업군 확장 과정에서 배치 관리 기준이 명확하지 않음
- 클레임 및 리콜 발생 시 배치 추적이 미흡하여 고객 신뢰도 저하로 이어지는 문제 발생

2

수요 및 판매속도 기반 물량 배분 최적화 부족

- 매장별 제품 소비 속도 및 출고 관리 시스템 미흡
- 실시간 재고-판매 데이터 연계 부족으로 인한 재고 과잉 및 품질 문제 발생

3

리드타임 기반 신선도 유지 관리 체계 미흡

- 외부 요인이 시스템 상 자동 반영되지 않아 포장재를 투입하는데에 일괄 배분이 일어남
- 과다 투입 시 포장 원가 상승, 과소 투입 시 도착 전 제품 이상 발생으로 물류비용 최적화와 품질 유지 사이의 균형을 깨뜨림

4

B2B 유통 및 기업 고객 맞춤 주문, 재무 프로세스의 비효율

- 고객 사업군별로 배치, 유통기한, 납기 조건 등이 상이하나 이에 대한 통합 관리 시스템 부재
- B2B 고객의 정기 대량 주문이 이메일, 엑셀 기반 수기 처리로 운영되어 처리 리드타임 증가

5

모바일 환경에서 최적화된 애플리케이션 확장성 부족

- 모바일을 통한 유통기한 확인과 반품 상태 등을 현장에서 즉시 입력하지 못해 실시간 재고 확인 불가
- 외부 주문 변경 시 현장과 본사 간 정보 전달의 지연이 발생

기업 5 : 석유 정제 및 제조 전문 기업

대주제 : 수익성 분석을 적용한 통합 재무 및 공급망 관리 서비스

해외 산유국으로부터 원유를 수입해 고부가가치 석유 제품을 생산하는 에너지 정제 테크 기업

핵심 사업 모델



수요처 맞춤형 원료 공급



유가, 환율 실시간 연동 단가제



고수율 보장형 정밀 정제 서비스

Business Challenges

1

제품이 동시에 쏟아지는 공정의 관리 한계

- 휘발유, 경유 등 여러 제품이 동시에 나오는 정유 공정의 특성을 관리하기 어려움
- 정확한 데이터 부재로 최적의 생산 효율을 찾아내는 속도가 현저히 늦어 짐

2

외환 변동 및 연산품 원가 배분 복잡성

- 환율 변동과 제품별 원가 배분 기준이 맞물리지 않아, 실시간 변하는 실제 마진을 파악하기 어려움
- 시장 가격 변동 시 어떤 제품의 생산 비중을 조정해야 수익이 극대화되는지에 대한 데이터가 부족함

3

품질 서비스와 공정 제어 시스템 간 연동 부재

- 품질 분석 결과가 생산 시스템과 분리되어 기준 미달 원료의 공정 투입을 자동 차단하지 못함
- 부적합 원료 투입 시 완제품 품질 저하는 물론 정제 설비가 손상될 위험이 상존함

4

입고 물량 계량 차이 및 실재고 불일치

- 하역, 입고, 출하 사이에서 온도나 계기 오차로 인한 미세 물량 차이가 지속 발생함
- 이송 중 증발 손실 등이 정산되지 않아 장부 재고와 실 재고간 불일치가 발생함

5

현장 모바일 연동 부재 및 데이터 단절

- 모바일 기기를 통한 데이터 입력이 불가능하여 현장과 전산 재고 간의 시차가 발생함
- 현장과 사무실 간의 정보 공유 체계가 없어 입고 및 정산 과정의 관리 투명성 확보가 어려움

기업 6 : 화장품 제조 및 유통 기업

자체 브랜드 화장품을 제조하고 국내외 유통 채널로 판매하는 기업

대주제 : 수익성 분석을 적용한 통합 재무 및 공급망 관리 서비스

핵심 사업 모델



자체 브랜드 화장품 제품 개발 및 제조



배치 기반 품질 관리 및 생산 운영



국내외 다채널 유통 네트워크 운영 및 판매 채널 관리

Business Challenges

1

다국적 거래에서 환율 관리의 복잡성

- 수출 비중 급증으로 달러, 엔화 등 다양한 통화 거래가 발생하나 실시간 환율 반영 체계가 부족
- 매출 처리와 대금 관리 시 환율 적용 시점이 달라 회계 오류 발생
- 월말 결산 시 환율 변동에 따른 평가 손익 산출이 어려워 정확한 현금 흐름 파악에 한계

2

제품별 수익성 분석 체계 부족

- 제품별로 발생하는 원재료비, 생산비, 물류비를 통합해 원가를 산정하기 어려움
- 다양한 판매 채널별 수수료, 프로모션 비용, 물류비 등을 반영한 실질적 마진 분석 도구 부재

3

채널, 거래처별 판매 정책 운영의 복잡성

- 판매 채널과 거래처별 가격 및 할인 정책 관리가 복잡
- 수기 관리에 따른 오주문 발생 및 대규모 수출에 필요한 각종 증빙 서류 작성에 과도한 시간이 소요
- 거래처별 리베이트 정산이 늦어지고 데이터 불일치가 발생하여 해외 파트너사와의 신뢰 관계가 저하

4

원료 특성을 반영한 생산, 재고 최적화 한계

- 유통기한 기반 재고 운영 체계 미흡
- 품질 관련 이슈 발생 시 생산 이력 추적 시스템 부재로 인한 원인 분석 및 대응 지연

5

현장 업무 처리 및 실시간 의사결정 모바일 지원 한계

- 영업팀 고객 방문 시 실시간 재고 확인 및 주문 처리 불가
- 경영진 출장 중 핵심 KPI 모니터링 및 승인 업무 처리 제약

기업 7 : 가구 제조 기업

가구를 제조 및 판매와 렌탈 서비스를 함께 운영하는 가구 제조, 유통 기업

대주제 : 구독과 렌탈을 위한 판매 및 통합 재무관리 서비스

핵심 사업 모델



가구 제조 및 완제품 판매



주문형 맞춤 가구 제작



가구 렌탈 서비스

Business Challenges

1

수요 예측 기반 생산 및 자재 운영 체계 미흡

- 판매 데이터 기반 수요 예측 부재로 품질과 과잉 재고가 동시에 발생하여 재고 비용 증가
- 자재 및 사입 반제품의 리드타임, 단가 변동이 구매 계획에 즉시 반영되지 않아 생산 지연
- 외주 자재에 대한 안전재고 관리 기준 부족으로 수요 변동 발생 시 대응 어려움

2

병행 생산(MTS/MTO)으로 인한 운영 복잡성 증가

- MTS와 MTO 공정 병행으로 생산 공정 간 병목 현상 및 일정 충돌 발생
- 고객 옵션 변경 사항이 생산 계획 및 자재 소요량 계획에 즉시 반영되지 않아 오발주와 재작업 발생
- 긴급 오더 발생 시 생산 부하를 고려한 가용성 점검이 수작업으로 이루어져 납기 신뢰도 저하

3

렌탈 자산 가치 및 재무 통제 체계 미흡

- 자산 등급별 잔존가치 산정 기준이 명확하지 않아 장부 가치와 실물 가치 간 괴리 발생
- 재렌탈 시 적정 임대료 산정 및 중고 판매 시 마진 분석의 정확도 저하
- 회수 제품의 재상품화 비용 산정 기준 부재

4

고객 및 제품 단위 수익성 분석 체계 미흡

- 복잡한 렌탈 계약 조건이 통합 관리되지 않아 매출 인식 및 정산 리스크 발생
- 자재 단가 변동, 물류비, 감가상각비를 반영한 실질 마진 분석 어려움

5


현장 업무 및 실시간 정보 연계를 위한 모바일 지원 체계 부족

- 설치 및 렌탈 회수 작업 결과가 사후 입력되어 전산 재고와 실물 재고 간 불일치 발생
- 배송 파손 등 돌발 상황 발생 시 즉시 보고 체계 미흡으로 물류 대응 지연
- 주소지 오류 및 현장 사양 변경 등 예외 상황의 모바일 기반 실시간 반영 체계 부재



- 1 프로젝트 일정
- 2 프로젝트 추진 단계
- 3 시스템 아키텍처
- 4 프로젝트 주제
- 5 프로젝트 업무 프로세스
- 6 Ground Rule

5. 프로젝트 업무 프로세스 (예시)

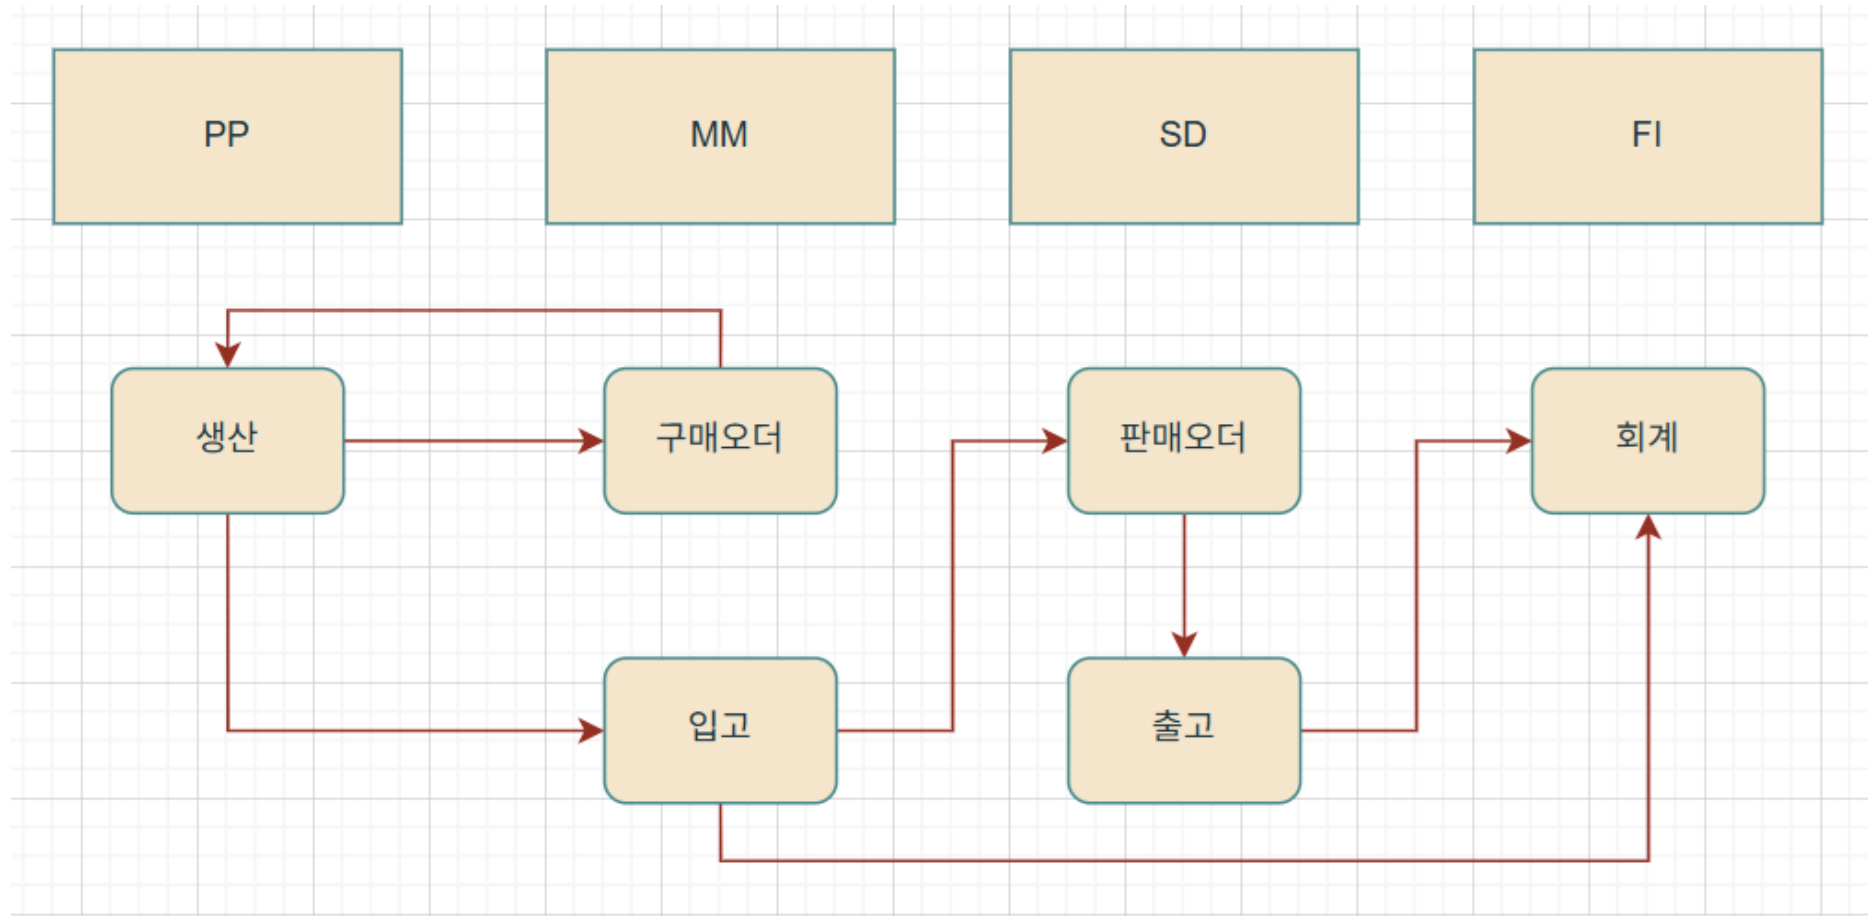

SAP의 기본적인 프로세스를 단순화하여 표현한 예시
이를 참고하여 기업 상황에 맞게 모듈, 순서나 프로세스 타일을 자유롭게 변경 가능
단, 전체 프로세스 흐름을 나타내는 화살표와 모듈은 반드시 포함



- 1 프로젝트 일정
- 2 프로젝트 추진 단계
- 3 시스템 아키텍처
- 4 프로젝트 주제
- 5 프로젝트 업무 프로세스
- 6 **Ground Rule**

6. Ground Rule – ABAP 개인별 최소 구현 항목

구현 항목	최소 구현 항목
Database 구축	테이블 팀별 최소 30개 이상 (텍스트 테이블 포함) 개인별 3개 이상 * 프로그램이나 뷰에 포함되어 있어야 카운트
View	DB view, Maintenance view: 최소 개인별 1개 제작 CDS View: 최소 개인별 2개 제작
Program	조회용 프로그램: 최소 개인별 3개씩 개발 트랜잭션 프로그램: 최소 개인별 2개씩 개발

구현 항목은 최소 단위이며, 해당 단위 개수 이상으로 구현해야 함
 공동 개발물은 개인별 최소 구현 항목으로 인정되지 않음 (팀별 구현 항목으로는 카운트 가능)
 배치잡 등록 시 반드시 작업 주기 최소 하루 단위 이상 설정 (지키지 않을 시 임의 삭제 가능)
 ** 난이도 있는 기능이 구현된 프로그램이 좋은 평가를 받을 수 있음

6. Ground Rule – Fiori 개인별 최소 구현 항목

구현 항목	세부 사항		
최소 구현 개수	개인별 프로그램 3개 이상 제작 - 최종 산출물에서 Launchpad에 추가된 타일 프로그램만 인정 - 각 모듈 별로 Launchpad 그룹화 필수 "프로그램", "구현 기능" 항목에서 각각 2종류 이상 제작 필수 - 조회 프로그램 + 팝업 / 조회 프로그램 + 팝업 / 상신 프로그램 + 화면 이동 (O) - CUD 프로그램 + 팝업 + 화면이동 / 상신 및 승인 프로그램 / 조회 프로그램 (X, 구현 기능 미충족) - 조회 프로그램 + 팝업 / 조회 프로그램 + 화면 이동 / 조회 프로그램 (X, 프로그램 미충족)		
프로그램	1. 조회 프로그램 2. 생성/변경/삭제 프로그램(CUD) 3. 상신 및 승인 프로그램	구현 기능	1. 팝업 2. Search Help 기능 3. 화면 이동 4. 차트

구현 항목은 최소 단위이며, 해당 단위 개수 이상으로 구현해야 함

공동 개발물은 개인별 최소 구현 항목으로 인정되지 않음 (팀별 구현 항목으로는 카운트 가능)

** 복합 기능이 한 프로그램에서 동시 구현 되었을 때 좋은 평가를 받을 수 있음



Appendix 산출물 양식(예시)

SAP

Public





Index

S-Air의 현재 구조와 한계를 분석하고, 실제 시스템 프로세스로 개선안을 도출합니다.



- 01 기업 소개 / 팀원 소개**
 - S-Air 기업 개요 및 주요 서비스
 - 프로젝트 추진 배경
 - 역할 기반 팀원 소개
- 02 S-Air의 AS-IS / TO-BE**
 - 기존 시스템의 핵심 문제점
 - AS-IS vs TO-BE 비교
- 03 통합 프로세스 설계**
 - 컨테이너 주문 흐름과 모듈 연계
 - 모듈 ERD 프로세스

01 S-Air 기업 소개

S-Air 기업 개요 및 주요 서비스

S-Air는 국내외 여객 및 화물 운송 서비스를 제공하는 통합 항공사로, 자체 ERP 기반의 운영 시스템을 통해 예약, 발권, 화물 처리, 정비까지 전 영역을 관리하고 있습니다. 글로벌 항공 네트워크와 탄탄한 운영 인프라를 바탕으로, 고객 중심의 항공 경험과 운영 효율성 강화를 핵심 가치로 삼고 있습니다.



Appendix 2. 산출물 – 과정 관리(WBS)

조 이름		프로젝트명	SAP S/4HANA 기반 설치 서비스 운영 최적화 시스템 구축 프로젝트	
작성자	안현욱	고객	B2B(건설사)	
최초 작성일	2025-03-26	문서 버전	V 1.0	
		최종 수정일	2025-03-27	

진행단계	수행내용	상세수행내용	산출물/작업문서	진척율	기간	3월			4월					5월					6월			
						3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W
1. 준비 및 분석	계획	프로젝트 환경 셋업, 멤버구성	1. WBS	100%	03.21~03.31																	
		프로젝트 상세 일정 확정	2. 프로젝트 계획서	100%	03.21~03.31																	
	요구사항 분석	1차 컨 리뷰 대비 산출물 작성	3. 프로젝트 계획서 및 피피티 작성	100%	03.21~03.31																	
		프로세스 분석	4. 모듈별 마스터 테이블 정의	100%	03.21~03.31																	
		1차 컨 피드백 반영	-	100%	04.04~04.07																	
	개발 준비	개발 리스트 수립	5. AS-IS, TO-BE 프로세스 정의서	100%	03.21~04.11																	
		2차 컨 리뷰 피드백 반영	6. 아키텍처 정의서	100%	03.21~04.11																	
2. 설계	개발 설계	DB 설계	7. ERD	100%	03.21~03.31																	
		CBO 테이블 설계	8. 테이블 정의서	100%	03.21~03.31																	
		화면설계	9. 개발 프로그램 리스트	100%	04.01~04.04																	
			10. 매핑정의서	100%	04.04~04.07																	
			11. 프로그램 스펙	100%	04.01~04.04																	
			12. 기능/화면설계서	100%	04.04~04.11																	
			13. 단위테스트 시나리오	100%	04.04~04.11																	
			14. 통합테스트 시나리오	100%	04.04~04.11																	
3. 구현 및 테스트	코딩	이전 산출물을 기반으로 개발	15. 개발결과 상세사항서	100%	04.01~05.02																	
		1차 개발(ABAP)	-	100%	04.01~04.18																	
		2차 개발(ABAP)	-	100%	04.21~05.02																	
		3차 개발(FIORI)	-	100%	05.07~05.23																	
	통합 테스트(화면&기능)	단위 테스트	16. 개발 진도관리	100%	05.07~05.30																	
			17. ISSUE REPORT	100%	05.07~05.30																	
			18. 단위테스트 결과서	100%	05.07~05.30																	
4. 완료	통합 테스트	최종 통합 테스트 수행	19. 통합테스트 결과서	100%	06.02~06.09																	
	완료 및 발표 준비	완료 보고서 제작	20. 완료 보고서	100%	06.02~06.09																	
		영상 제작	21. 영상 (결과보고/시연)	100%	06.02~06.09																	
		포트폴리오 제작	22. 포트폴리오	100%	06.02~06.09																	

Appendix 3. 산출물 – 과정 관리(회의록)

주간 보고서			
프로젝트 명: SAP ERP 도입 프로젝트			
9프로젝트 담당 팀 조직 : 김현수(PM, 1팀 팀장), 김선우(1팀 부팀장), 안현욱(2팀 팀장), 박선하(2팀 부팀장), 이상원(1팀), 채현수(1팀), 임도은(2팀)			
전제 진척률 (80%)			
금주 보고 사항		차주 보고 사항	
기간 : 2025-04-21 ~ 2025-04-25		기간 : 2025-04-28 ~ 2025-05-02	
진행 내역	진척률	진행 내역	진척률
김현수 : 구매오더 프로그램 보완, 구매요청 승인 프로그램 제작, 원자재 구매할/금액 조회 프로그램 제작	80%	김현수 : 구매오더 프로그램 완성, 구매오더 승인 프로그램 제작, 완제품 및 원자재 조회 프로그램 제작	
김선우 : 완제품 검수 보완, 생산오더 등록 보완, 완제품 검수 조회 제작	80%	김선우 : 검수 조회 프로그램 제작, 판매 송장 제작 예정	
이상원 : 판매오더 제작완료, 판매오더 승인 제작	70%	이상원 : 출고 프로그램 제작	
채현수 : 폐기 프로그램, 생산자재 필요 프로그램 제작	90%	채현수 : 폐기 재고 조회, 생산 필요자재 조회 프로그램 제작 예정	
안현욱 : 전표 생성 프로그램 제작완료, 합계잔액시산표 제작	80%	안현욱 : 재무상태표 프로그램 제작, 그 외 프로그램 보완 예정	
박선하 : 총계정원장 프로그램 제작완료	90%	박선하 : 반제프로그램 제작 예정	
임도은 : 원자재 검수 프로그램 제작, 구매 진행 현황 대시보드 프로그램 제작	80%	임도은 : 구매 진행 현황 대시보드 프로그램 제작, 재고 이동 프로그램 제작	
프로그램 리뷰 및 피드백		MRP 프로그램 제작	
		개인별 레벨 단계	
		프로그램 리뷰 및 피드백	
완료 내역		예상 완료 내역	
프로그램 제작 예정 대부분 완료했으나 보완점 필요		MRP 제작 및 개인 프로그램 제작	

프로젝트 진행 중 특이사항		
개발 진행 중 문제 사항		
ALV 관련 프로그램 삭제로 프로그램 제작 이슈		
개발 지연 발생 여부		개발 지연 사유
○		ALV 관련 프로그램 삭제로 프로그램 제작 이슈
	발생한 기술적 오류	기술적 오류 해결 방안 및 조치
1		
2		
3		
작성 일자 : 2025-04-25 작성자 : 김현수		

Appendix 4. 산출물 – AS-IS / TO-BE 분석 문서

02 S-Air의 AS-IS / TO-BE 기존 시스템의 핵심 문제점(AS-IS)

디지털 전환 지연이 초래한 운영 비효율성과 고객 만족도 저하[AS-IS]

1. 노후화된 시스템과 낮은 통합성
- ERP 시스템의 노후화로 인해 예약, 발권, 물류 등 핵심 기능 간 데이터 연동과 통합 운영이 어려움.
2. 부정확한 수요 예측과 비효율적인 자원 배분
- 수요 예측 정확도가 낮아 좌석·화물 공간 및 항공기·인력 배치가 최적화되지 않아 운영 낭비가 발생.
3. 자동화 부족과 프로세스 연계 미흡
- 예약, 발권, 화물 처리 등 주요 업무의 자동화 수준이 낮고, 외부 파트너사 간 시스템 연계도 부족함.
4. 모바일 환경 대응력 부족
- 모바일 기반 실시간 정보 조회와 조치가 어려워 현장 대응 속도와 정확성이 떨어짐.



02 S-Air의 AS-IS / TO-BE SAP S/4HANA 도입 후 기대효과 (TO-BE)



SAP S/4HANA 기반 통합 플랫폼 구축을 통한 운영 효율성 제고와 고객 경험 혁신[TO-BE]

1. SAP S/4HANA 기반의 통합 플랫폼 구축으로 시스템 현대화 및 통합성 강화
- 예약·발권·물류 등 주요 업무 간 실시간 데이터 연동 및 통합 운영 구현
2. AI 기반의 정확한 수요 예측과 자원 최적화
- 좌석 및 화물 공간 수요 정확도 향상으로 효율적 자원 운영 및 비용 절감
3. 모듈 자동화와 외부 시스템 간 실시간 연계 강화
- SAP S/4HANA를 통한 업무 자동화 및 외부 파트너사와의 표준 인터페이스 구축으로 업무 효율성 향상
4. SAP Fiori 기반 모바일 중심의 실시간 업무 대응 환경 구축
- 모바일 중심의 실시간 정보 조회 및 현장 대응력 향상으로 신속한 의사결정 지원 및 고객 서비스 품질 개선

Appendix 5. 산출물 – 조직정의서


01.

프로젝트 개요

조직도



Appendix 6. 산출물 – 엔터티 관계 다이어그램(ERD)

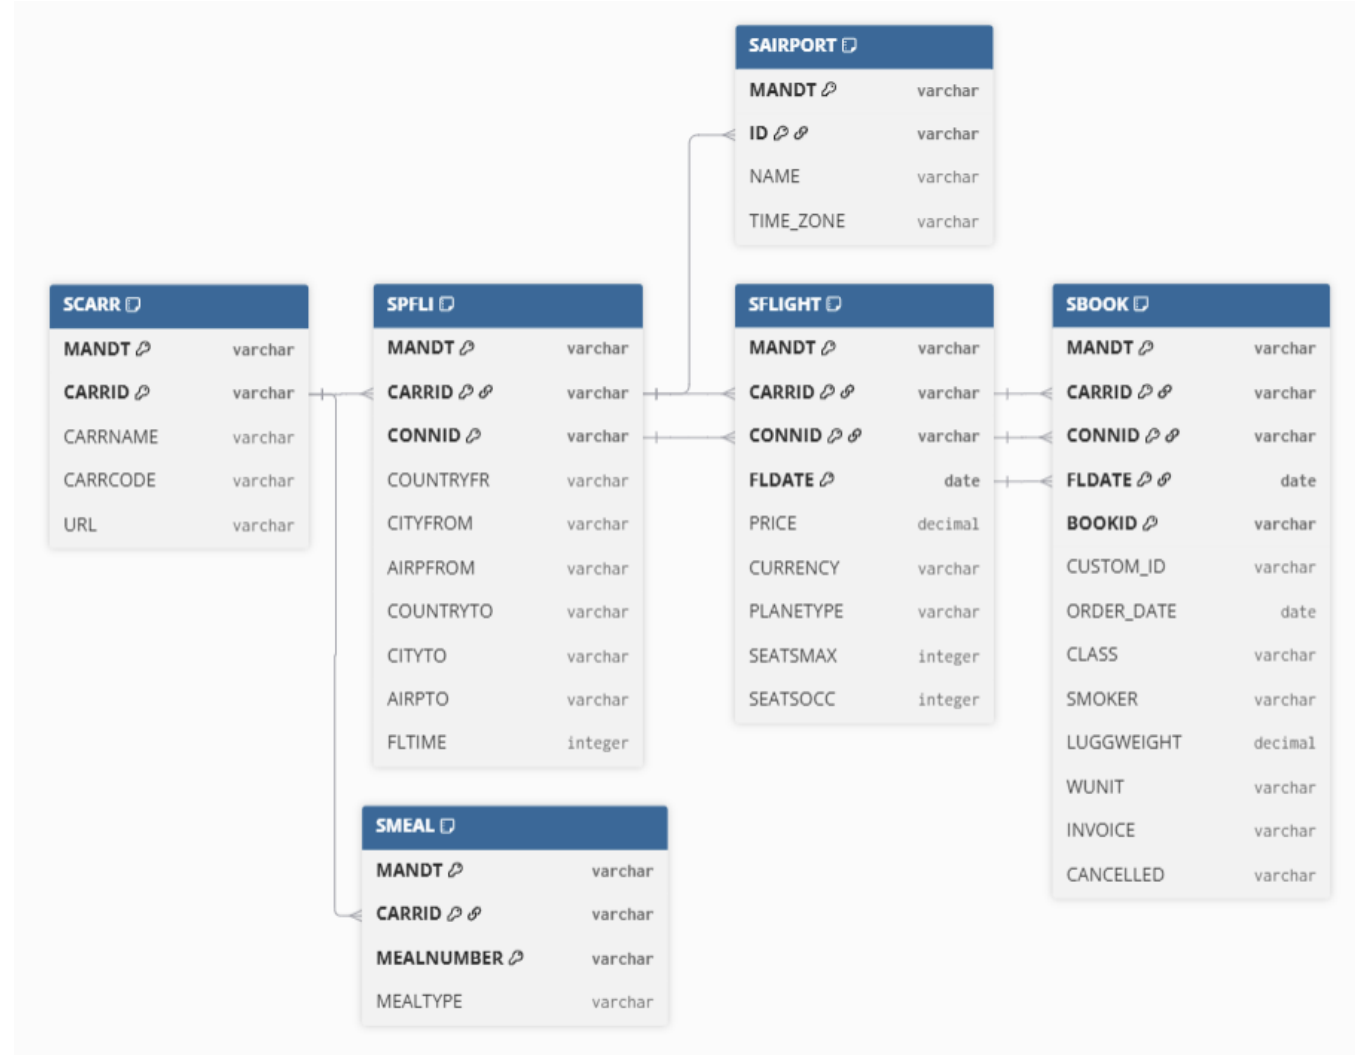

Appendix 7. 산출물 – 테이블 기술서(정의서)

CBO 테이블 정의서								
모듈명				작성일	2026.01.01			
테이블	SCARR			작성자	임도은			
테이블명	항공사 테이블							
테이블용도	항공사 정보를 저장하는 마스터 테이블							
Field	Key	Desc	Data Element	Domain	Type	Length	Fixed Value	Check Table
MANDT	PK/FK	Client	S_MANDT	MANDT	CLNT	3		T000
CARRID	PK	Airline Code	S_CARR_ID	S_CARR_ID	CHAR	3		
CARRNAME		Airline name	S_CARRNAME	S_NAME20	CHAR	20		
CURRCODE		Local currency of airline	S_CURRCODE	S_CURR	CUKY	5		SCURX
URL		Airline URL	S_CARRURL	S_URL	CHAR	255		

* 기본 기술서 양식 제공 예정이나 정의서에 추가 내용이 있을 경우 수정 및 추가 가능

* 프로그램 테이블 변경 시 테이블 기술서도 지속적으로 업데이트 필요!!

Appendix 8. 산출물 – 개발 프로그램 리스트

					SD		FI		PP		MM		FI		SD		MM	
					1		2		3		4		5		6		7	
	조인원	8	1조		안현욱		김선우		이상원		채현수		임도은		김현수		박선하	
Ground Rule 항목	소구현	소구현	갯수	%	갯수	%	갯수	%	갯수	%	갯수	%	갯수	%	갯수	%	갯수	%
DB테이블	24	3	48	200%	8	267%	6	200%	8	267%	7	233%	6	200%	7	233%	6	200%
DB View	8	1	7	88%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
유지보수 View	8	1	7	88%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
배치프로그램	8	1	8	100%	1	100%	2	200%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
리포트	16	2	14	88%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
모듈콜	16	2	14	88%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
CDS View	8	1	7	88%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
ABAP Ground Rule 반영률			119%		145%		136%		145%		136%		127%		136%		127%	
Fiori APP	16	2	14	88%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
Fiori-결재	1	-	1	100%		-	1	100%		-		-		-		-		-
Fiori-차트	3	-	2	67%		-		-		-		-	1	100%	1	100%		-
Fiori-생성/변경/삭제	1	-	2	200%	1	100%		-		-		-		-		-	1	100%
Fiori-검색	1	-	2	200%		-		-	1	100%	1	100%		-		-		-
Fiori-조회	1	-	5	500%	1	100%		-	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%		-
Fiori-팝업	1	-	1	100%		-		-		-		-		-		-	1	100%
Fiori-화면이동	1	-	1	100%		-	1	100%		-		-		-		-		-
FIORI/UI5 Ground Rule 반영률			113%															

모듈	Ground Rule 항목	프로그램명 / 테이블	프로그램 제목	프로그램 설명	T-COD	완료 여부(Y/N)	설계자	개발자
SD	DB테이블	ZTSD_0100	[SD] 판매계획 Header	판매계획 헤더 상세		0	김현수	안현욱
SD	DB테이블	ZTSD_0110	[SD] 판매계획 Item	판매계획 아이템 상세		0	김현수	안현욱
SD	DB테이블	ZTSD_0200	[SD] 주문 관리 Header	주문 관리 헤더 상세		0	김현수	안현욱

Appendix 9. 산출물 – 개발 일지(주간 보고서)

주간 개발 일지			
주차	26.02.25 ~ 26.02.25	반	CL1
조	3조	이름	홍길동
진행 내역			
모듈	MM	프로그램 명	ZC5MM0001
프로젝트 명: SAP ERP 도입 프로젝트			
상태: 구현중/테스트 및 보완중/구현완료			
내용: 예시 1) 무슨 데이터를 어떤 방법/로직으로 구현하여 어떠한 결과물을 만들어냈다. (구현중일 경우) 예시 2) 테스트 진행 중 이런이런 오류가 났다. 어떤 로직에서 문제가 있었고, 이것 어떻게 수정할 예정이다. (혹은 수정하였다, 테스트 및 보완중일 경우) + 차후 어떤 기능을 추가할 예정이든지, 어떤 프로그램 개발을 시작할 예정 1) 검수 자재 데이터를 ALV Edit 기능을 통해 수치와 자재를 입력할 수 있게 수정하였음. 2) 검수 자재 데이터의 불합격 수량이 기존 수량을 넘을 경우, 그에 대해 ALV Edit 셀 칸 색상을 변경하여 사용자에게 가시성을 더함과 동시에 SAVE 기능이 불가능하도록 막음. 3) 검수 데이터의 입력 사항이 있을 경우, BACK이나 다른 동작을 진행할 시, 그에 대한 행동을 제어함. 4) 현재, EA 단위를 가진 데이터의 소수점 입력이 가능하여 이를 막을 예정임. 5) 추후 검수 프로그램이 마무리 되면 송장 검증 프로그램을 구현할 예정.			


기능 구현	
발생한 기술적 오류	기술적 오류 해결 방안 및 조치
o ALV Edit으로 인해 수정 없이 저장할 경우 메시지 타입이 사라지는 문제가 발생함.	o 해당 동작의 Chaged_Data를 살펴 sy-ucomm을 따로 설정하여 메시지가 사라지지 않도록 조정함.

- * 매주마다 담당자가 취합하여 각 반 사내강사에게 제출할 예정
- * 평가에 반영되며 제출 성실성, 내용 충실도를 평가 예정

Appendix 10. 산출물 – 프로그램 스펙서(Functional & Technical Spec)


03 | PM

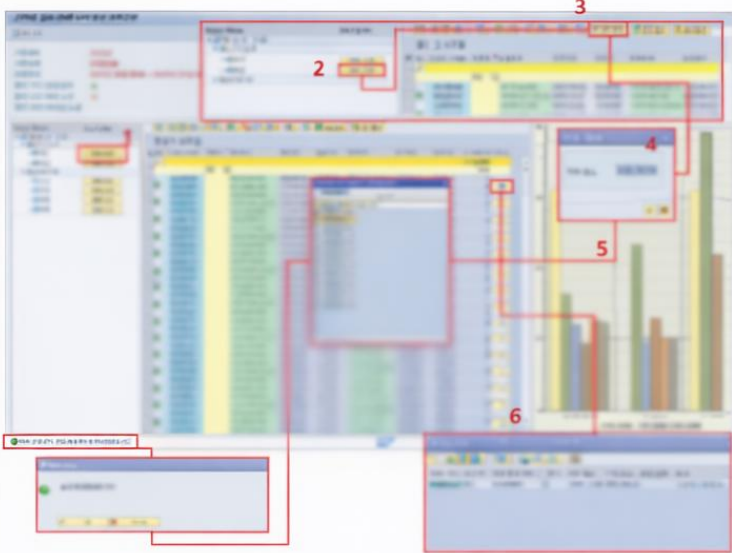

기능/개요	정비 도달 확인	프로그램명	SAPMZC103PM0001	T-CODE	ZC103PM0001	팀명	삼만리항공
작성자	이상원		정비 전략 도달 확인 프로그램			모듈	PM
개발자	이상원	작성일	2025.06.06	개발완료일	2025.06.06	개발항목	Module Pool
스토리보드				화면레이아웃			
1) 조회조건 2) 기능 3) 사용 테이블							


Appendix 11. 산출물 – 통합 테스트 시나리오

통합 테스트 시나리오			
검수대상 구분		예상결과	담당자
SD	판매오더 생성 프로그램	(조회) 허브의 창고에 존재하는 재고에 대한 수량, 가용 재고 수량 등을 조회한다	안현욱
		(생성)판매오더 헤더 정보를 입력하고 ALV에 행을 추가하여 판매오더 아이템 정보를 입력한 후, 생성 버튼을 누르면 해당 판매오더 정보가 생성된다.	
	판매오더 조회 및 결재 프로그램	(조회)판매 유형에 해당하는 판매오더 정보를 조회한다.	안현욱
		(수정)미결 상태인 판매오더에 대하여 승인 또는 반려를 진행한다.	
			김현수
			김현수
			김현수

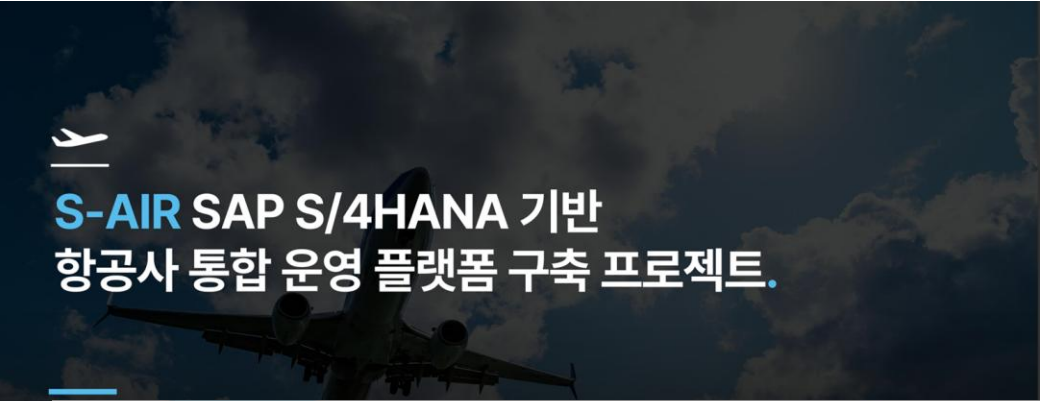

Contents →

- 1. 프로젝트 개요.
- 2. 프로젝트 수행 절차 및 방법.
- 3. 추진과제.
- 4. 기대효과 및 제언.

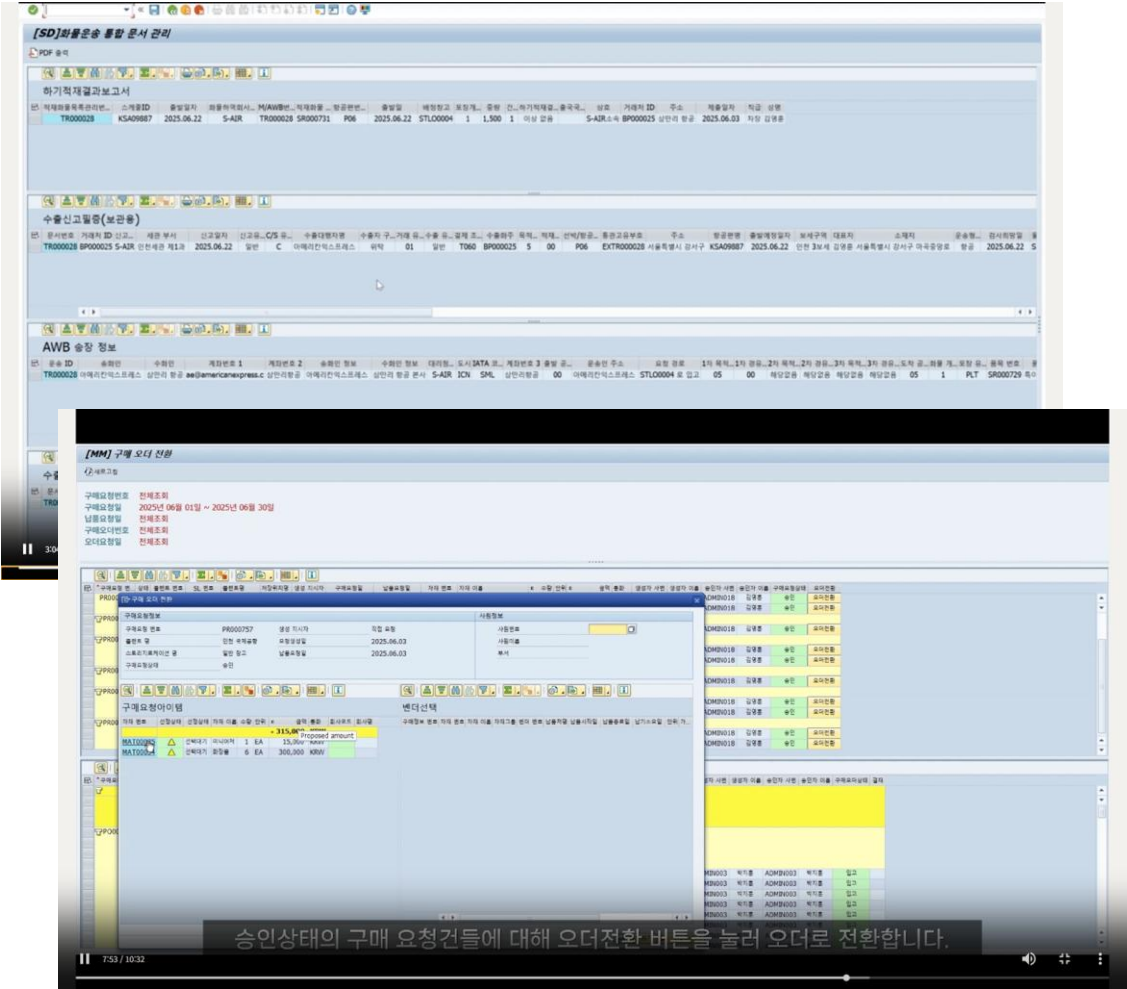



Thank you.

© SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. See Legal Notice on www.sap.com/legal-notice for use terms, disclaimers, disclosures, or restrictions related to SAP Materials for general audiences.

Public

서울반 공지 - Study Room 사용 안내

스터디룸 time table												
테이블	테이블1	테이블2	테이블3	테이블4	테이블1	테이블2	테이블3	테이블4	테이블1	테이블2	테이블3	테이블4
날짜	3/16/2026				3/17/2026				3/18/2026			
일정	설계				설계				설계			
오전	CL1 1조	CL2 1조	CL3 1조	CL4 1조	CL3 2조	CL4 2조	CL5 2조	CL6 2조	CL5 3조	CL6 3조	CL1 4조	CL2 4조
오후	CL5 1조	CL6 1조	CL1 2조	CL2 2조	CL1 3조	CL2 3조	CL3 3조	CL4 3조	CL3 4조	CL4 4조	CL5 4조	CL6 4조

스터디룸은 CODE 교육생들의 프로젝트를 위한 공간으로, 개인 휴식이나 장시간 자리 점유 목적의 사용은 지양

사용 규칙

1. 이용 시간 준수

- 매 달 조별 사용 스케줄이 공지될 예정
- 오전/오후로 나누어 운영, 시간 엄수

2. 학습 환경 유지

- 큰 소리 대화, 통화, 소음 발생 행동은 자제 및 쓰레기 정리 필수
- 스터디룸 내 비품 및 장비 파손 또는 이상 발생 시 즉시 각 반 사내강사에게 전달

상단의 규칙 위반 시 해당 조 혹은 반의 스터디룸 사용 제한



Thank you.

© SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. See Legal Notice on www.sap.com/legal-notice for use terms, disclaimers, disclosures, or restrictions related to SAP Materials for general audiences.

Public
